



HUMAN RESOURCE PLAN TEMPLATE

HUMAN RESOURCE PLAN MADES

**ALTAMIRA DEVELOPERS
COLOMBIA**

27/04/2026





TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION.....	2
ROLES AND RESPONSIBILITIES.....	3
PROJECT ORGANIZATIONAL CHARTS.....	4
STAFFING MANAGEMENT.....	5





INTRODUCTION

Este plan de gestión de recursos humanos describe cómo se organizarán, gestionarán y desarrollarán los recursos del proyecto MADES. Su propósito es asegurar que el equipo cuente con las habilidades necesarias, una distribución clara de responsabilidades y una coordinación efectiva durante todo el ciclo de vida del proyecto.

La gestión de recursos humanos es clave en MADES, ya que el proyecto se desarrolla bajo metodología Scrum, lo que implica colaboración continua, entregas incrementales y adaptación constante.

Este plan incluye:

- Definición de roles y responsabilidades
- Estructura organizacional del proyecto
- Plan de adquisición y uso de recursos
- Estrategias de evaluación de desempeño
- Mecanismos de reconocimiento

El objetivo es garantizar que el equipo trabaje de manera eficiente, coordinada y alineada con los objetivos del proyecto.

ROLES AND RESPONSIBILITIES

La definición de roles y responsabilidades en el proyecto MADES permite establecer claramente las funciones, niveles de autoridad y competencias requeridas para cada integrante del equipo. Esto facilita la coordinación del trabajo, evita ambigüedades en la toma de decisiones y asegura que cada actividad del proyecto tenga un responsable definido. Dado que el proyecto se desarrolla bajo metodología Scrum, los roles también promueven la colaboración continua, la autoorganización del equipo y la entrega incremental de valor en cada sprint.

Project Manager (PM) / Product Owner (PO), (1 puesto) – Yesid Alejandro Martínez Guerrero: responsable del éxito general del proyecto MADES. Debe aprobar las decisiones clave del proyecto y asegurar que las actividades se ajusten al alcance, cronograma y criterios de calidad definidos. Supervisa el avance del proyecto y comunica el estado a los interesados según el plan de comunicaciones. Además, prioriza el backlog, define los requerimientos funcionales y valida que los entregables cumplan con los criterios de aceptación. También evalúa el desempeño del equipo y facilita la toma de decisiones estratégicas. Requiere habilidades en liderazgo, gestión de proyectos, análisis de negocio y comunicación efectiva.

Scrum Master (SM), (1 puesto) – Johan Sebastián Gil Salamanca: responsable de facilitar la implementación de la metodología Scrum en el proyecto. Coordina y modera las ceremonias ágiles (Sprint Planning, Daily, Review y Retrospective), asegurando que se ejecuten de manera



efectiva. Da seguimiento al cumplimiento del cronograma y ayuda a identificar y remover impedimentos que afecten al equipo. Promueve la mejora continua y asegura que se sigan las buenas prácticas ágiles. Además, apoya la gestión de riesgos del proyecto. Requiere habilidades en metodologías ágiles, liderazgo colaborativo y comunicación.

Desarrollador Backend, (1 puesto) – Johan Sebastián Gil Salamanca: responsable del desarrollo de la lógica del servidor, APIs y la gestión de la base de datos del sistema MADES. Implementa la lógica de negocio, mecanismos de autenticación y control de acceso, así como la integración con PostgreSQL. Garantiza la seguridad, integridad y rendimiento de los datos. Trabaja en conjunto con el frontend para asegurar la correcta comunicación entre cliente y servidor. Debe reportar avances al PM y participar en pruebas técnicas. Requiere conocimientos en Node.js, Express, bases de datos relacionales y diseño de APIs.

Desarrollador Frontend (FE), (1 puesto) – Edison Ferney Gutiérrez Buitrago: responsable del diseño e implementación de la interfaz de usuario del sistema MADES utilizando React. Asegura la usabilidad, accesibilidad y coherencia visual de la aplicación. Implementa componentes reutilizables, gestiona el estado de la aplicación y realiza la integración con los servicios del backend. Participa en pruebas funcionales y validación de la experiencia de usuario. Debe comunicar avances al PM y colaborar estrechamente con el backend. Requiere habilidades en React, TypeScript, diseño UI/UX y consumo de APIs.

Desarrollador Backend / Infraestructura (BE), (1 puesto) – Miguel Leonardo Ávila Ávila: responsable de la configuración y gestión de la base de datos, así como del soporte técnico relacionado con la infraestructura del entorno de desarrollo. Participa en el diseño del esquema de datos, implementación de consultas y pruebas de integración. Apoya la configuración de herramientas como Docker y la conexión entre servicios. Trabaja en conjunto con el backend principal para asegurar la estabilidad técnica del sistema. Requiere conocimientos en PostgreSQL, modelado de datos, Docker y entornos de desarrollo.

PROJECT ORGANIZATIONAL CHARTS

El siguiente diagrama RACI presenta la relación entre las tareas del proyecto MADES y los miembros del equipo, permitiendo identificar claramente quién es responsable de ejecutar cada actividad, quién es el encargado final de su cumplimiento, así como los roles que deben ser consultados o informados. Cualquier modificación en la asignación de responsabilidades deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager. Dichos cambios se gestionarán conforme al proceso de control de cambios definido para el proyecto, garantizando la actualización y adecuada distribución de todos los documentos relacionados.



Actividad	Project Manager / PO (Yesid)	Scrum Master / Backend (Johan)	Frontend (Edison)	Backend / BD (Miguel)
Levantamiento de requerimientos	A	R	C	C
Diseño de arquitectura	A	R	C	R
Diseño de interfaz (UI/UX)	C	C	R	I
Desarrollo backend (API, lógica)	C	R	C	R
Desarrollo frontend	C	C	R	I
Integración frontend-backend	C	R	R	C
Configuración base de datos	I	C	I	R
Implementación autenticación y roles	A	R	C	C
Pruebas funcionales	C	R	R	R
Pruebas de integración	C	R	C	R
Gestión de riesgos	A	R	C	C

Key:

R – Responsible for completing the work

A – Accountable for ensuring task completion/sign off

C – Consulted before any decisions are made

I – Informed of when an action/decision has been made

STAFFING MANAGEMENT

Staff Acquisition:

El equipo está compuesto completamente por recursos internos de Altamira Developers.

No se contempla subcontratación.

Los roles fueron asignados según:

- Habilidades técnicas




- Experiencia previa
- Responsabilidades académicas

El trabajo será remoto y colaborativo.

Resource Calendars:

El proyecto MADES tendrá una duración aproximada de doce semanas, distribuidas en cuatro sprints de tres semanas cada uno. Todos los recursos del equipo estarán involucrados desde el inicio del proyecto, participando activamente en las actividades de planificación, desarrollo y seguimiento. Durante los dos primeros sprints, la carga de trabajo será mayor para los desarrolladores frontend y backend, quienes dedicarán la mayor parte de su tiempo a la construcción de funcionalidades principales. En los sprints 3 y 4, el enfoque se trasladará progresivamente hacia la integración, pruebas y validación, manteniendo la participación de todo el equipo, pero con una ligera reducción en la carga de desarrollo intensivo. El Project Manager/Product Owner y el Scrum Master participarán de manera continua durante todo el proyecto, asegurando la correcta gestión, seguimiento y cumplimiento de los objetivos establecidos. No se contempla la liberación anticipada de recursos, ya que el equipo se mantendrá activo hasta la finalización del proyecto para garantizar la calidad de los entregables.

Software Project Upgrade Resource Histogram

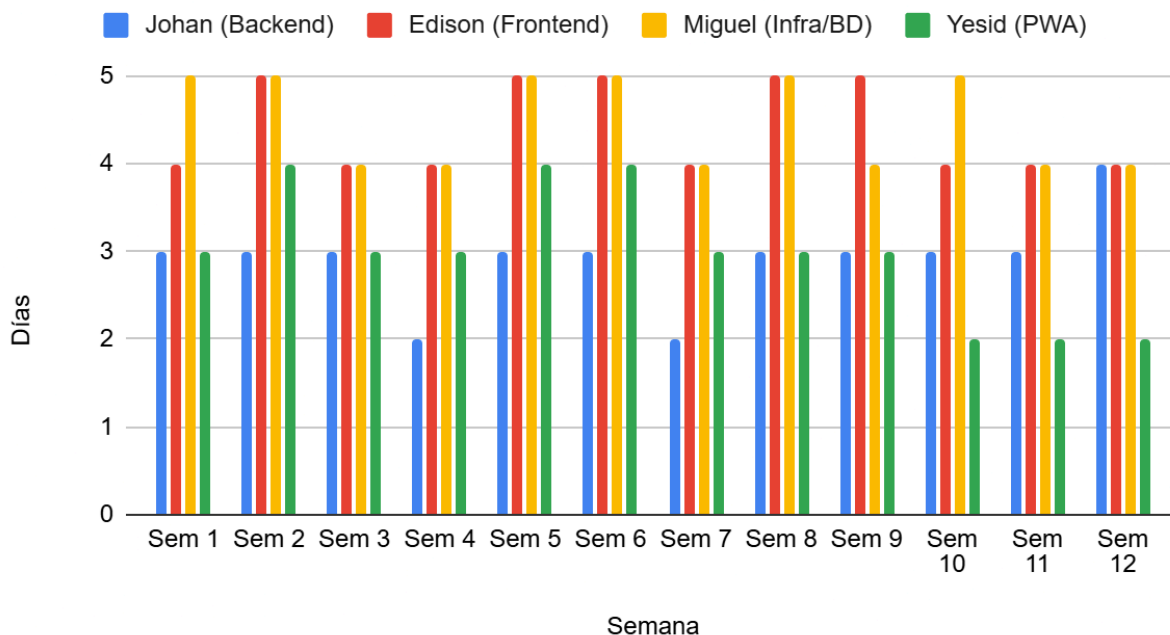

Training:



No se requiere capacitación formal inicial, ya que el equipo cuenta con conocimientos base. Sin embargo, se contempla:

- Autoaprendizaje en:
 - PWA (Service Workers)
 - Sincronización offline
 - Docker
- Apoyo entre miembros del equipo (aprendizaje colaborativo)

Performance Reviews:

El Project Manager realizará una revisión inicial de las actividades asignadas a cada integrante del equipo al comienzo del proyecto, comunicando claramente las expectativas y criterios de desempeño. A lo largo de cada sprint, se hará seguimiento continuo al desempeño de los miembros del equipo, evaluando el cumplimiento de tareas, la calidad de los entregables y la colaboración dentro del equipo. Estas evaluaciones se apoyarán en las ceremonias Scrum, especialmente en las revisiones y retrospectivas. Al cierre del proyecto, el Project Manager consolidará la retroalimentación del desempeño individual y del equipo, con el fin de identificar oportunidades de mejora y reconocer el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Recognition and Rewards:

Dado el contexto académico del proyecto, se implementarán incentivos no monetarios:

- Reconocimiento en presentaciones finales
- Documentación de aportes individuales





SPONSOR ACCEPTANCE

Aprobado por Altamira Developers el 27/04/2026

