



COMMUNICATIONS MANAGEMENT PLAN TEMPLATE

COMMUNICATION MANAGEMENT PLAN MADES

MADES
TUNJA, BOYACÁ, COLOMBIA

22 DE MAYO DE 2026





TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION.....	3
COMMUNICATIONS MANAGEMENT APPROACH.....	3
COMMUNICATIONS MANAGEMENT CONSTRAINTS.....	4
STAKEHOLDER COMMUNICATION REQUIREMENTS.....	5
ROLES.....	6
PROJECT TEAM DIRECTORY.....	7
COMMUNICATION METHODS AND TECHNOLOGIES.....	8
COMMUNICATIONS MATRIX.....	10
COMMUNICATION FLOWCHART.....	11
GUIDELINES FOR MEETINGS.....	11
COMMUNICATION STANDARDS.....	13
COMMUNICATION ESCALATION PROCESS.....	14
GLOSSARY OF COMMUNICATION TERMINOLOGY.....	15





INTRODUCTION

El propósito de este Plan de Gestión de las Comunicaciones es definir los requisitos de comunicación del proyecto MADES y establecer cómo se distribuirá la información entre los interesados. Este documento define qué información será comunicada, cómo se realizará la comunicación, la frecuencia de las actividades de comunicación, los responsables y los canales utilizados durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Este plan también establece procedimientos para el manejo de información confidencial, la gestión de cambios en las comunicaciones, la documentación de reuniones y el escalamiento de conflictos relacionados con la comunicación. El plan servirá como marco de referencia para asegurar una colaboración efectiva entre todos los participantes durante el desarrollo de la aplicación web progresiva (PWA) enfocada en gestión de inventario, sincronización offline, notificaciones, reportes y lectura de códigos de barras mediante cámara.

COMMUNICATIONS MANAGEMENT APPROACH

La comunicación efectiva es fundamental para el éxito del proyecto MADES. El Project Manager mantendrá una comunicación proactiva para garantizar que todos los interesados permanezcan informados sobre el progreso del proyecto, riesgos, cambios de cronograma, entregables y decisiones técnicas.

El equipo trabajará bajo la metodología Scrum, utilizando reuniones de sprint planning, daily meetings, sprint reviews y retrospectivas. Los requisitos de comunicación están documentados en la Matriz de Comunicaciones y servirán como guía para todas las actividades comunicativas.

A medida que el proyecto avance, las necesidades de comunicación podrán cambiar debido a modificaciones en el alcance, cronograma o recursos. El Project Manager será responsable de actualizar este plan cuando sea necesario y distribuir las modificaciones aprobadas a todos los interesados.

COMMUNICATIONS MANAGEMENT CONSTRAINTS

Todas las actividades de comunicación deberán realizarse dentro del cronograma, alcance y recursos aprobados del proyecto. Las comunicaciones no deben generar costos adicionales ni retrasos no autorizados.

Las restricciones principales incluyen:

- Disponibilidad limitada debido a horarios académicos.
- Dependencia de conexión a internet para reuniones virtuales.
- Coordinación constante entre frontend, backend e infraestructura.
- Manejo confidencial del código fuente y documentación técnica.
- Uso obligatorio de formatos estandarizados definidos por la institución académica.



Toda la documentación formal será almacenada en repositorios compartidos con acceso restringido al equipo autorizado.

STAKEHOLDER COMMUNICATION REQUIREMENTS

Los requisitos de comunicación de los stakeholders serán identificados y gestionados durante todo el proyecto. Cada interesado requiere diferentes niveles de detalle y frecuencia de comunicación.

Los principales requisitos incluyen:

- Actualizaciones semanales del avance de los sprints.
- Reporte inmediato de problemas técnicos críticos.
- Presentaciones periódicas de funcionalidades implementadas.
- Documentación de entregables y resultados de pruebas.
- Coordinación continua entre los miembros del equipo.

El Project Manager mantendrá actualizadas las preferencias de comunicación de cada stakeholder y garantizará el acceso a los canales y herramientas necesarias.

ROLES

Patrocinador del Proyecto

Responsable de aprobar y respaldar el proyecto, así como supervisar su éxito general.

Project Manager

Responsable de coordinar el proyecto, gestionar las comunicaciones, realizar seguimiento del cronograma y supervisar el cumplimiento de objetivos.

Equipo de Desarrollo

Encargado de implementar las funcionalidades frontend, backend, sincronización offline, reportes, notificaciones y lectura de códigos de barras.

Líder Técnico

Responsable de supervisar las decisiones técnicas, arquitectura e integración de componentes.

Stakeholders

Personas interesadas en el éxito y resultado del proyecto, incluyendo docentes y evaluadores.

PROJECT TEAM DIRECTORY

La siguiente tabla presenta la información de contacto de todas las personas identificadas en este plan de gestión de comunicaciones. Las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono que aparecen en esta tabla se utilizarán para comunicarse con estas personas.



Role	Name	Title	Organization/ Department	Email	Phone
Patrocinador del Proyecto	Altamira Developers	Empresa Patrocinadora	Dirección General	-	-
Product Owner	Yesid Alejandro Martínez Guerrero	Product Owner / Desarrollador	Altamira Developers	yesid.martinez04@uptc.edu.co	3212554009
Scrum Master / Project Manager	Johan Sebastián Gil Salamanca	Scrum Master / Desarrollador	Altamira Developers	johan.gil@uptc.edu.co	3125406205
Stakeholders del Proyecto	Dueños y administradores de pequeños y medianos negocios	Stakeholders del sistema MADES	Área Operativa	No aplica	No aplica
Cliente	Negocios y almacenes locales usuarios de MADES	Cliente Final	Sector Comercial	No aplica	No aplica
Desarrollador Frontend	Edison Ferney Gutiérrez Buitrago	Desarrollador Front	Altamira Developers	edison.gutierrez01@uptc.edu.co	3228369127
Desarrollador Backend	Miguel Leonardo Avila Avila	Desarrollador Back	Altamira Developers	miguel.avila04@uptc.edu.co	3202510024
Líder Técnico	Yesid Alejandro	Líder Técnico Backend	Altamira Developers	yesid.martinez04@uptc.edu.co	3212554009



	Martínez Guerrero				
--	----------------------	--	--	--	--

COMMUNICATION METHODS AND TECHNOLOGIES

El proyecto MADES utilizará diferentes métodos y tecnologías para facilitar la colaboración:

Método	Propósito
Microsoft Teams / Google Meet	Reuniones virtuales y seguimiento
WhatsApp	Comunicación rápida del equipo
GitHub	Gestión del código fuente y control de versiones
Trello / Jira	Gestión de tareas y backlog
Correo electrónico	Comunicación formal
Google Drive	Almacenamiento de documentación

Toda la documentación del proyecto será almacenada en repositorios compartidos accesibles para el equipo.





COMMUNICATIONS MATRIX

La siguiente tabla identifica los requisitos de comunicaciones para este proyecto.

Communication Type	Objective of Communication	Medium	Frecuenc y	Audience	Owner	Deliverable	Format
Sprint Planning	Definir objetivos y tareas del sprint	Reunión virtual	Cada sprint	Equipo del proyecto	Project Manager	Sprint Backlog, objetivos del sprint y asignación de tareas	Acta de reunión y backlog en herramienta Scrum
Daily Meetings	Revisar avances y bloqueos	Reunión virtual	Diario	Equipo del proyecto	Scrum Master	Estado diario de tareas, impedimentos y próximos pasos	Minuta corta / tablero Scrum actualizado
Sprint Review	Presentar funcionalidades terminadas	Reunión virtual	Cada sprint	Stakeholders	Project Manager	Incremento funcional del producto y feedback recibido	Presentación y acta de revisión
Retrospectiva	Analizar desempeño del sprint	Reunión virtual	Cada sprint	Equipo del proyecto	Scrum Master	Acciones de mejora continua y lecciones aprendidas	Acta retrospectiva
Reporte de Estado	Informar avance del proyecto	Correo electrónico	Semanal	Stakeholders	Project Manager	Reporte de avance, riesgos e incidencias	Documento PDF o correo estructurado
Reuniones Técnicas	Resolver temas técnicos	Reunión virtual	Según necesidad	Equipo técnico	Líder Técnico	Soluciones técnicas, decisiones de arquitectura y tareas técnicas	Minutas técnicas y documentación actualizada



PROJECT
MANAGEMENT
DOCS

ProjectManagementDocs.com






COMMUNICATION FLOWCHART

Los eventos se originan en dos fuentes, externos (stakeholders, clientes) e internos (equipo, sprints), y ambos convergen en el Project Manager, donde este determina el tipo de comunicación necesaria y la enruta por tres canales, comunicación formal (correo/reportes semanales), ceremonias Scrum (Sprint Planning, Daily Meeting, Sprint Review, Retrospectiva vía Google Meet), o reuniones técnicas según necesidad.

Todos los canales alimentan un repositorio centralizado de documentación (Google Drive, GitHub, Jira/Trello, actas) y finalmente, se evalúa si la situación requiere escalación: si no, se cierra; si sí, se eleva al Patrocinador.

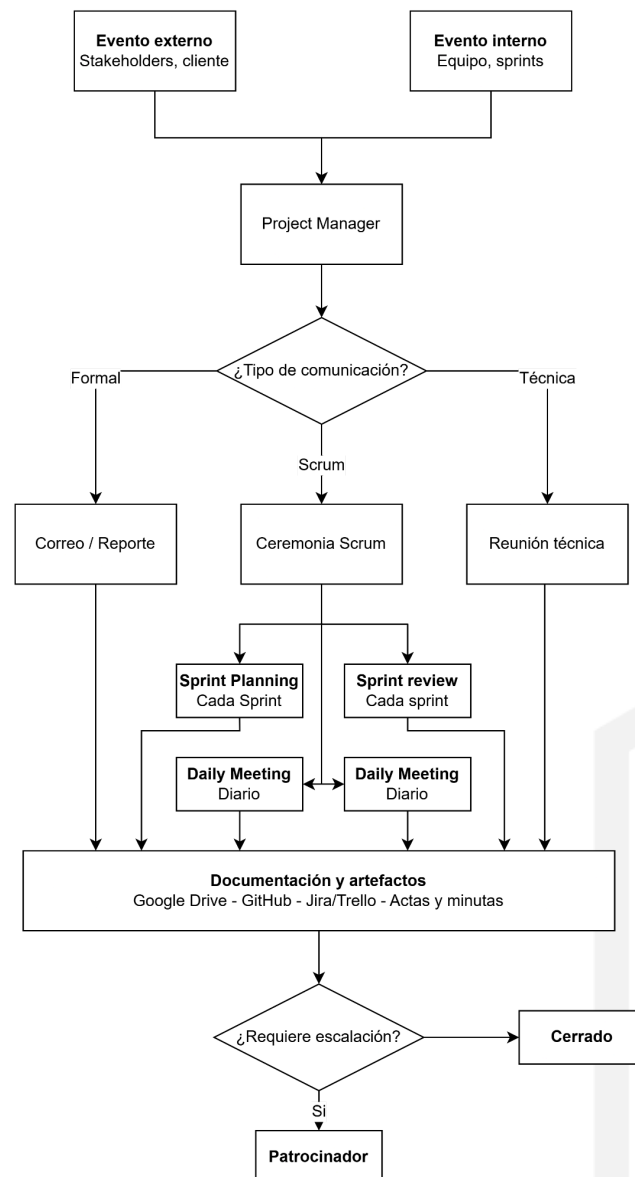



GUIDELINES FOR MEETINGS

Agenda de Reunión

La agenda será distribuida antes de cada reunión e incluirá objetivos, participantes y tiempos estimados.

Minutas

Las minutas serán compartidas después de cada reunión formal e incluirán decisiones y tareas pendientes.

Acciones Pendientes

Cada reunión generará tareas asignadas a responsables específicos con fechas de cumplimiento.

Gestión del Tiempo

Las reuniones deberán iniciar y finalizar puntualmente para mantener la eficiencia del proyecto.

COMMUNICATION STANDARDS

Para el proyecto MADES, el equipo de desarrollo de Altamira Developers utilizará formatos y lineamientos estandarizados para todas las comunicaciones formales del proyecto. Esto permitirá mantener consistencia, claridad, trazabilidad y organización durante el desarrollo de la aplicación PWA de gestión de inventario.

Las comunicaciones formales definidas en la matriz de comunicaciones incluyen:

Sprint Planning

El equipo utilizará plantillas estandarizadas para:

- Agenda de planeación del sprint
- Acta de Sprint Planning
- Registro de objetivos del sprint
- Sprint Backlog

Toda la información generada durante la planeación será almacenada en el repositorio documental del proyecto y compartida mediante Google Drive y GitHub Projects.



Daily Meetings (Daily Scrum)

Las reuniones diarias seguirán una estructura estándar basada en Scrum:

- ¿Qué hice ayer?
- ¿Qué haré hoy?
- ¿Qué impedimentos tengo?

Los bloqueos identificados serán registrados por el Scrum Master y documentados en el tablero del proyecto.

Sprint Review

Para las revisiones de sprint se utilizarán:

- Plantilla estándar de presentación de funcionalidades
- Registro de historias completadas
- Evidencias funcionales y demostraciones
- Documento de validación del incremento

Las demostraciones del MVP o incremento funcional se realizarán mediante videoconferencia y quedarán documentadas en actas de revisión.

Sprint Retrospective

Las retrospectivas utilizarán formatos definidos para:


- Aspectos positivos del sprint
- Problemas encontrados
- Acciones de mejora
- Compromisos del siguiente sprint

Las conclusiones serán registradas por el Scrum Master y compartidas con todo el equipo.

Reportes de Estado del Proyecto

Los reportes de estado seguirán una estructura estándar que incluirá:

- Avance general del sprint/proyecto
- Historias completadas
- Riesgos identificados
- Problemas abiertos

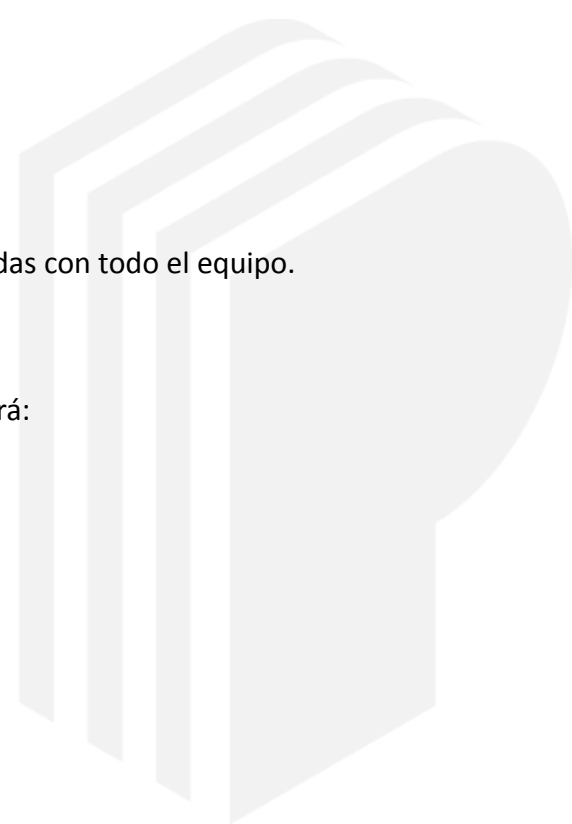



- Métricas de avance
- Estado del cronograma

Estos reportes serán enviados semanalmente por correo electrónico a los stakeholders y almacenados en el repositorio documental.

Reuniones Técnicas

Las reuniones técnicas utilizarán:

- Agenda técnica
- Registro de decisiones arquitectónicas
- Minutas de reunión
- Diagramas técnicos y evidencias

Las decisiones relacionadas con Angular, Spring Boot, PostgreSQL, JWT, sincronización offline y arquitectura PWA deberán quedar documentadas.

Documentación Técnica

Toda la documentación técnica deberá cumplir estándares de:

- Claridad y trazabilidad
- Control de versiones
- Estructura modular
- Nombres consistentes de archivos y carpetas

La documentación incluirá:

- Diagramas de arquitectura
- APIs REST
- Configuración de Spring Security
- Estructura de base de datos
- Diseño de componentes Angular
- Configuración del Service Worker

Estándares para Repositorios y Archivos

El proyecto utilizará las siguientes convenciones:

- Control de versiones mediante Git y GitHub
- Uso de ramas: main, develop y ramas feature





- Convenciones de commits descriptivos
- Versionamiento incremental de documentos
- Organización estructurada de carpetas

Ejemplo:

- SPRINT1_ACTA_PLANEACION_v1.0.docx
- MADES_BACKEND_ARCHITECTURE_v2.pdf

Herramientas Oficiales de Comunicación

Las herramientas oficiales del proyecto serán:

- **Google Meet:** reuniones virtuales
- **WhatsApp:** comunicación rápida del equipo
- **Correo electrónico:** comunicaciones formales
- **GitHub:** seguimiento técnico y control de versiones
- **Google Drive:** almacenamiento documental

Comunicación Informal

Las comunicaciones informales entre miembros del equipo deberán mantenerse profesionales, claras y enfocadas en los objetivos del proyecto. Para este tipo de comunicación no será obligatorio utilizar plantillas o formatos específicos.

COMMUNICATION ESCALATION PROCESS

Priority	Definition	Decision Authority	Timeframe for Resolution
Prioridad 1	Bloqueo crítico del proyecto	Patrocinador	Menos de 4 horas
Prioridad 2	Problema importante de funcionalidad	Project Manager	1 día hábil
Prioridad 3	Problema menor de cronograma	Líder Técnico	2 días hábiles
Prioridad 4	Recomendación de mejora	Equipo de Desarrollo	Próximo sprint



GLOSSARY OF COMMUNICATION TERMINOLOGY

Term	Definition
Stakeholder	Persona o grupo interesado en el proyecto
Sprint	Iteración de trabajo en Scrum
Escalamiento	Proceso para resolver conflictos o problemas
Matriz de Comunicación	Tabla que define las actividades de comunicación
Daily Meeting	Reunión diaria de seguimiento
Sprint Review	Reunión de demostración de entregables





SPONSOR ACCEPTANCE

Approved by the Project Sponsor: Altamira Developers

Date: 22/05/2026

